Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 124983
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0477/40.13.83
e-mail: virtuall@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5116421
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/10/2018

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
VIRTUALL
VIOOLTJESHOF 9
1933 STERREBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: NEKKERSPOELSTRAAT 215 MECHELEN 2800
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/271bis
Datum onderzoek: 23/10/2018 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/10/2043 **Onderzoeker:** VAN PAESSCHEN RUDI
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: 541448820060784214 **Teller nr.:** 33756428 **Stand I :** 000729,6 **Stand II** -
Aansluiting: - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -
Dienstspanning: 2 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Aut. My **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardelektrode: **type:** Pen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 22,6 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** In orde **bijkomende diff.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: In orde **Controle foutlus:** In orde **Algemene isolatieweerstand:** ➢ 50 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** In orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 10

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.

BESLUIT

■ De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie


maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49


Schema de Position RCH

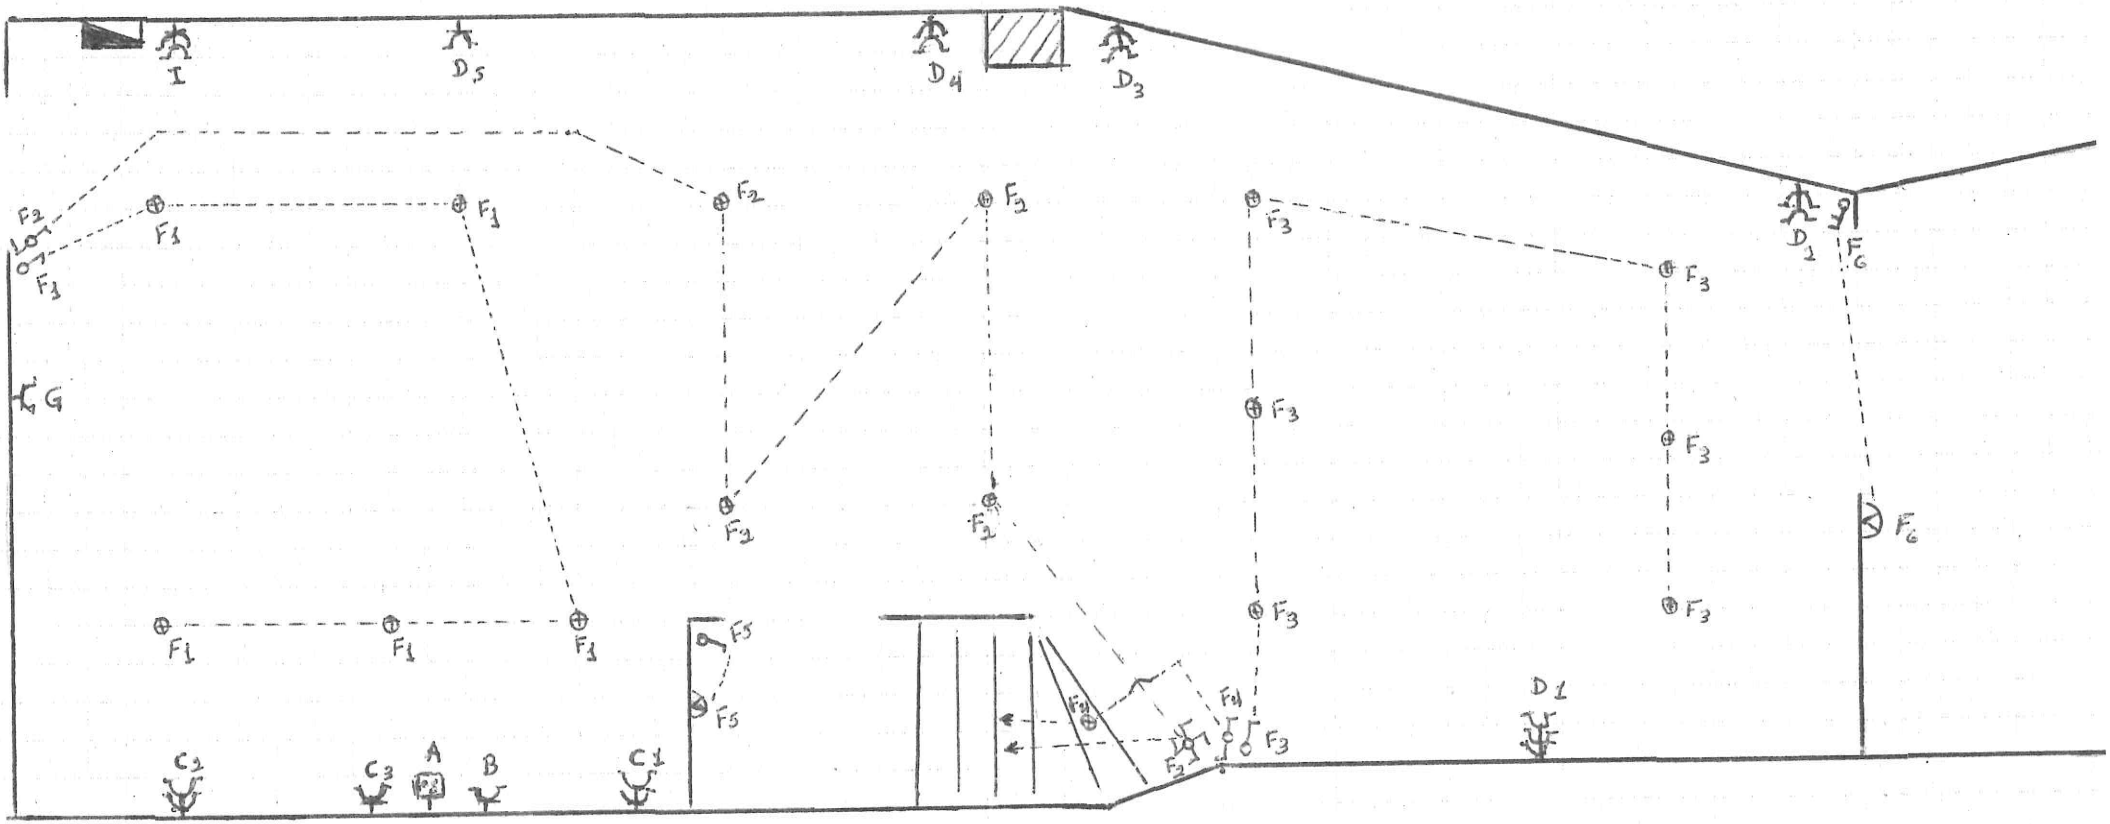


Van Paesschen Rudi
GSM 0496/290 694
rudi.vanpaesschen@ocb.be
OCB www.ocb.be
23/10/15

Valerie Benoit
Nekkerspoelstraat, 215 - Mechelen

Schema de Position 1ª Etage

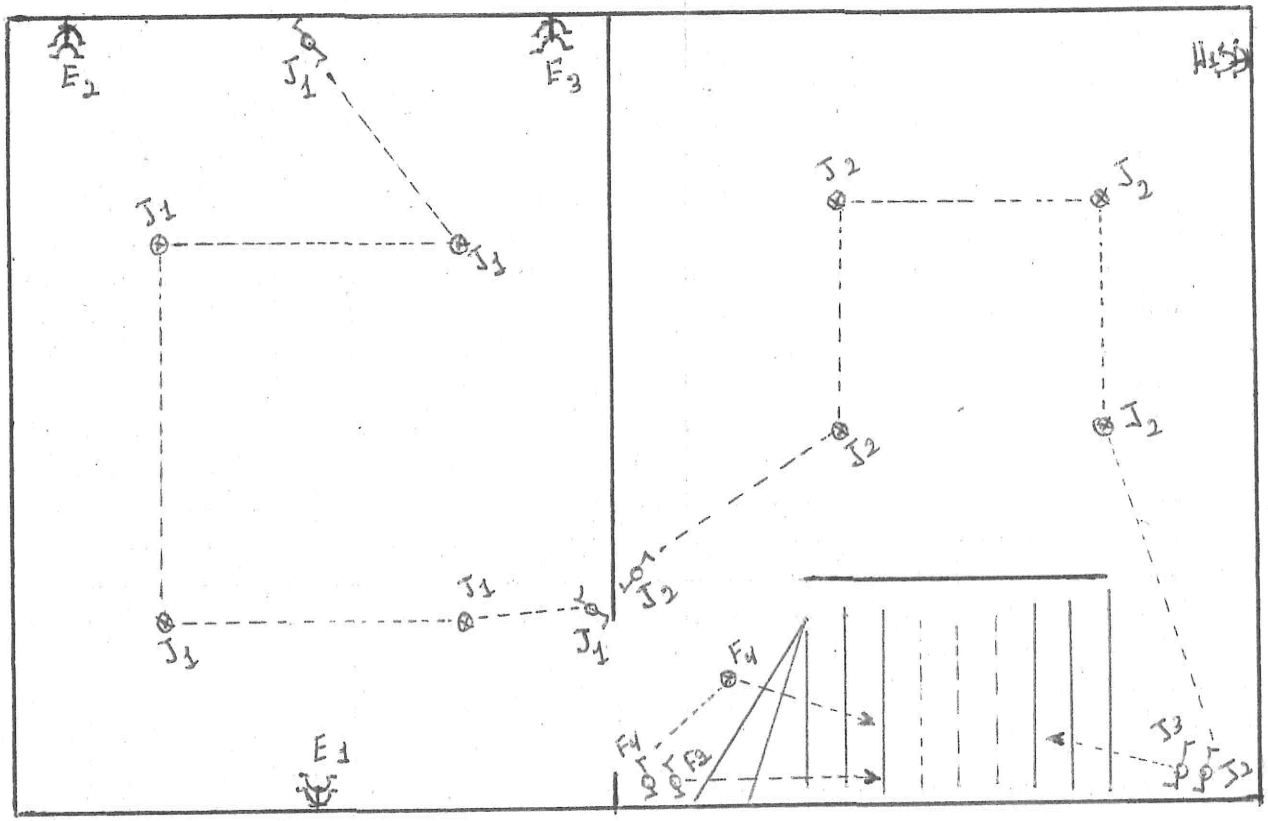

Schema de Position 2.e Etage

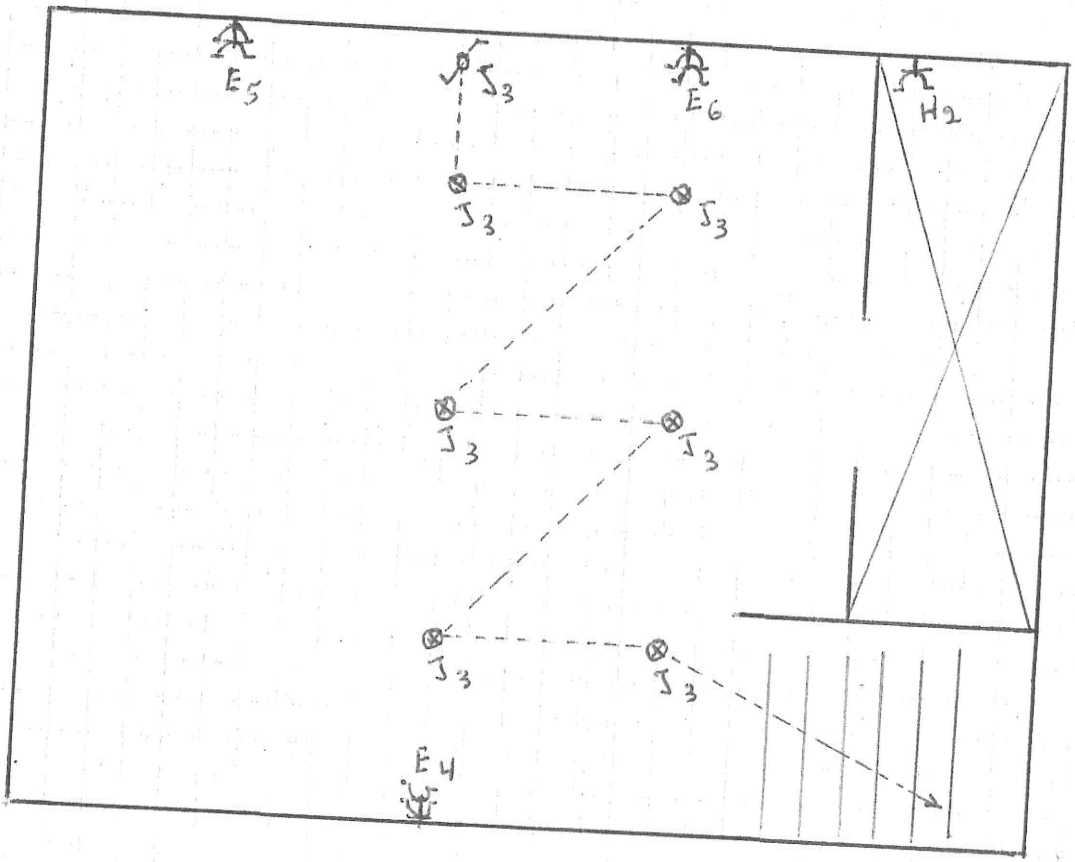

Schema Unifilaire. RdH · 1er et 2e Etage

